



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

**PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL DO
ESTADO DO CEARÁ**

- PROFISCO II CE -

OUTUBRO/2021

PROFISCO II EXECUTIVO



Implantação da Ferramenta PROFISCO II Executivo – Monitoramento das aquisições e Acompanhamento nas Missões do Banco

FERRAMENTAS UTILIZADAS:
Bizagi e Tableau

SISTEMA MANAGERPRO



Desenvolvimento do Sistema Managerpro

- Sistema informatizado e integrado com o Sistema Orçamentário, Contábil e Financeiro do Estado do Ceará:
- Prestação de Contas e adiantamento de recursos
- Relatórios de Auditoria

FERRAMENTA UTILIZADA:
Plataforma .Net, c/ Banco Oracle

GERENCIAL BID



- Monitoramento da execução do Profisco II:

- Contratos
- Pagamentos
- Relatórios de Desembolsos
- Relatório de Progresso
- Previsões de Pagamentos para próximos meses

FERRAMENTA UTILIZADA:
Excel

SUMÁRIO EXECUTIVO



- Sumário Executivo vinculado a conciliação bancária e ao Gerencial BID, demonstra por componente:
- Valores comprometidos
- Valores pagos
- Valores Desembolsados
- Saldo na conta do Programa
- Execução do Plano de Aquisição por Categoria (Bens, Consultoria Firma etc)
- Evolução dos Termos de Referência

FERRAMENTA UTILIZADA:
Excel

PRINCIPAIS AQUISIÇÕES EM LICITAÇÃO POR COMPONENTE

Explorar / CAT-CESINF / ... / Relatório Subproduto Profisco II / Aquisição ☆

Layouts de dispositivos

Desfazer Refazer Reverter Atualizar Pausar Pergunte aos dados Exibição: Original Alertas Inscrever-se Editar

Subproduto Metas Detalhadas Resultados Detalhados Outros Detalhes **Aquisição** Riscos

UNIDADE COORDENADORA DO PROFISCO II - UCP
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA

Secretaria: SECEX PGI | Coordenação: COTIC | Componente: 1 GESTÃO FAZEN... | Produto: 1.4 Plano de mod... | Subproduto: 1.4.8 Implantaçã... | Aquisição: 001 | Status da Aquisição: Em Andamento | Compromisso: (Tudo) | Filtro Compromisso: Possui Compromi...


Identificação da Aquisição

Aquisição	Número Sacc	Número Tramita	Proposta	Projeto	Compromisso	St. Compromisso
					encaminhar para UCP solicitar a 3ª terceira e últim	Realizado
					Acompanhar o envio da 2ª NO do BID e encaminhar para CECOC providenciar encaminhamento à CEL04	Realizado
					Acompanhar o envio da não objeção pelo BID	Realizado
					Acompanhar o trâmite para homologação, publicação e assinatura do contrato	Em Andamento
					Elaborar Relatório de Julgamento Técnico	Realizado
					Encaminhar não objeção as notas de esclarecimentos	Realizado

Plano de Ação

Entrega	Status da Entrega	Data Fim Programado	Prazo de Entrega
Aviso de Licitação ou Manifestação de Interesse (Publicado)	Concluído	18/03/2020	Em dia
Lista curta (Data do recebimento dos Portifólios) (Início)	Concluído	03/04/2020	Atrasado 550 dia(s)
Lista curta (Data do envio da SDP aos integrantes da lista curta)	Concluído	23/04/2020	Atrasado
Licitação (Certame - Data de recebimento de propostas)	Concluído	23/05/2020	Atrasado
Avaliação das propostas (relatório final)	Concluído	07/07/2020	Atrasado
Homologação da licitação (Publicação)	Atrasado	17/07/2020	Atrasado 445 dia(s)

Entregas Gráfico



Status	Porcentagem	Quantidade
Concluído	63%	5
Atrasado	38%	3

FERRAMENTAS DE ACOMPANHAMENTO – PROFISCO II EXECUTIVO

← Explorar / CAT-CESINF / ... / Relatório Subproduto Profisco II / Aquisição ☆

← Desfazer → Refazer ← Reverter Atualizar Pausar Pergunte aos dados Exibição: Original Alertas Inscrever-se Editar

Secretaria: Nulo | Coordenação: ARINS | Componente: 2 ADMINISTRAÇ... | Produto: 2.6 Processo de... | Subproduto: 2.6.2 Análise, mo... | Aquisição: 001 | Status da Aquisição: Em Andamento | Compromisso: (Tudo) | Filtro Compromisso: Possui Compromi...


Identificação da Aquisição

Aquisição	Número Sacc	Número Tramita	Proposta Projeto	Compromisso	St. Compromisso
001	06645468/2020		PROFISCO II (ARINS) 2.6.2.001 - CONSULT./SERV. EM OTIMIZ. DE ATENDIMENTO (PRESENC./ELETRÔN.) - CZRM	Acompanhar a elaboração do Relatório Técnico	Em Andamento
				Comissão de Julgamento acompanhar o recebimento das comprovações solicitadas a Elogroup pela CEL04	Em Andamento
				Elaboração do Relatório de Julgamento Técnico	Em Andamento

Plano de Ação

Entrega	Status da Entrega	Data Fim Programado	Prazo de Entrega
Termo de Referência aprovado	Concluído	17/04/2020	Atrasado
Edital e Minuta de contrato aprovados	Concluído	18/04/2020	Atrasado
Aviso de Licitação ou Manifestação de Interesse (Publicado)	Concluído	28/04/2020	Atrasado
Lista curta (Data do envio da SDP aos integrantes da lista curta)	Concluído	04/05/2020	Atrasado
Licitação (certame - Data de recebimento de propostas)	Concluído	03/06/2020	Atrasado
Avaliação das propostas (relatório final aprovado)	Atrasado	18/07/2020	Atrasado 444 dia(s)
Homologação da licitação (publicada)	Atrasado	28/07/2020	Atrasado 434 dia(s)
Assinatura do Contrato	Atrasado	07/08/2020	Atrasado 424 dia(s)
Contrato cadastrado no SACC	Atrasado	17/08/2020	Atrasado 414 dia(s)

Entregas Gráfico

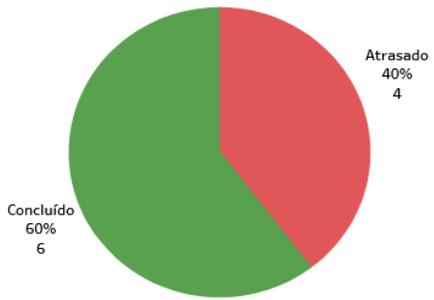

Status	Porcentagem	Quantidade
Concluído	60%	6
Atrasado	40%	4

Bem-vindo ao Manager PRO



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA



BID
Banco Interamericano
de Desenvolvimento

UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS - UCP

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL DO ESTADO DO CEARÁ - PROFISCO II

MANAGERPRO
Sistema de Gerenciamento do Profisco

FERRAMENTAS DE ACOMPANHAMENTO - MANAGERPRO



Manager PRO - v3.0.0.9 - HOMOL

Cadastros Pagamentos Solicitação Internalizações Relatórios

Relatório - Estado de Execução do Projeto

Nro. Solicitação: 13

SAP CRYSTAL REPORTS

Relatório Principal

ESTADO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

Nome do Organismo Executor: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ
 N.º do Contrato de Empréstimo ou Convênio de Cooperação Técnica: 4436/OC-BR
 No. da Solicitação: 13
 Data: 15/10/2021

Categoria e Subcategorias de Investimentos conforme Contrato / Convênio	Orçamento Vigente		Desembolso Acumulado por Categoria e Subcategoria de Investimento até a Solicitação Anterior		Desembolso por Categoria e SubCategoria de Investimento nesta solicitação		Desembolso Acumulado por Categoria e SubCategoria de Investimento
	BID (LMS1)	Aporte Local	BID	Aporte Local	BID	Aporte Local	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)
AI-Gestão Fazendária e Transparência Fiscal	27.004.207,00	3.333.333,00	16.551.074,41	2.034.570,37	2.686.991,67	562.571,61	19.238.066,08
AII-Administração Tributária e Contencioso Fiscal	34.172.683,00	3.666.667,00	14.212.203,01	2.442.811,74	1.094.021,29	1.240.147,31	15.306.224,30
AIII-Administração Financeira e Gasto Público	7.703.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1-Gestão do Programa - Monitoramento	178.000,00	0,00	38.772,28	0,00	4.924,05	0,00	43.696,33
B2-Gestão do Programa - Avaliação	240.000,00	0,00	29.023,89	0,00	26.742,30	0,00	55.766,19
C-Contingências	701.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. SUBTOTAL POR FONTE	70.000.000,00	7.000.000,00	30.831.073,50	4.477.382,11	3.812.679,30	1.802.718,91	34.643.752,90
B. ADIANTAMENTO DE RECURSOS			5.586.228,39		0,00		1.773.550,69

No. da página atual: 1 No. Total de Páginas: 1 Fator de Zoom: 100%

Relatório - Demonstrativo de Investimentos Acumulados - DIA

Nro. Exercício: 2021

SAP CRYSTAL REPORTS

Relatório Principal

Demonstrativo de Investimentos Acumulados -

(Expresso em US\$ dólares)

NOME DO ORGANISMO EXECUTOR: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ
 N.º do Contrato de Empréstimo ou Convênio de Cooperação Técnica: 4436/OC-BR
 Período terminado em: 2021 Data: 05/10/2021

Categoria de Investimento	Orçamento Vigente			Acumulado Anterior ao Exercício		Movimento do Exercício			
	TOTAL	BID	LOCAL	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	
	1=2+3	2	3	4	5	6=4+5	7	8	
								9=7+8	
Gestão Fazendária e Transparência Fiscal	30.337.540,00	27.004.207,00	3.333.333,00	14.828.805,41	1.617.343,45	16.646.148,89	4.409.287,30	779.798,50	5.189.065,79
Administração Tributária e Contencioso Fiscal	37.839.350,00	34.172.683,00	3.666.667,00	13.589.400,02	98.349,71	13.687.749,73	1.716.824,28	3.584.609,34	5.301.433,61
Administração Financeira e Gasto Público	7.703.400,00	7.703.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão do Programa - Monitoramento	178.000,00	178.000,00	0,00	37.135,17	0,00	37.135,17	6.561,16	0,00	6.561,16
Gestão do Programa - Avaliação	240.000,00	240.000,00	0,00	29.023,89	0,00	29.023,89	26.742,30	0,00	26.742,30

No. da página atual: 1 No. Total de Páginas: 1 Fator de Zoom: 100%


SUMÁRIO EXECUTIVO

ORGANISMO EXECUTOR: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ
Contrato de Empréstimo: 4436/OC-BR
Ano: 2021


EXECUÇÃO DO PROGRAMA

(MILHÕES)

	BID			LOCAL			TOTAL		
	US\$	%	R\$	US\$	%	R\$	US\$	%	R\$
ORÇAMENTO	70	100%	315	7	100%	31,5	77	100%	347
DESEMBOLSO	36,4	52%	180	6,3	90%	31	42,7	55%	210
EXECUTADO	34,7	50%	147	6,3	90%	30,8	41,0	53%	178

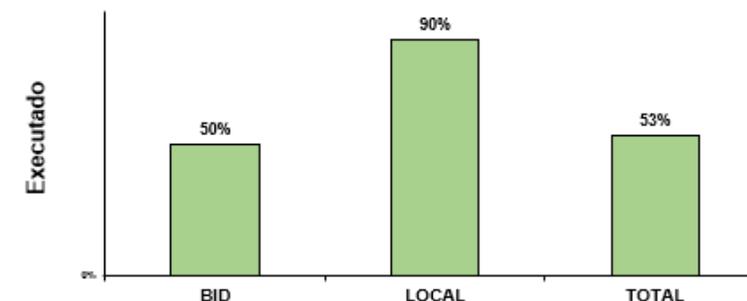

SALDOS FINANCEIROS DO PROGRAMA

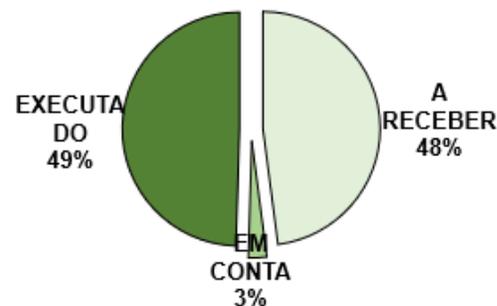

(MILHÕES)

	BID		
	US\$	%	R\$
A RECEBER	34	48%	151
EM CONTA	1,8	3%	10,0
EXECUTADO	34,7	50%	147
TOTAL	70	100%	315

PRESTAÇÃO DE CONTAS / SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

Último Desembolso: \$ 5,13 MM em 6/4/21 Executado: 66%

(MILHÕES)

	US\$	%	R\$
DESEMBOLSO BID	36,4	100%	180
PRESTADO CONTAS	30,8	85%	125,7
PGTOS A JUSTIFICAR	3,9	11%	21,5
SALDO EM CONTA	1,8	5%	10,0

% Executado do Saldo Adiantamento (OPS1): 69%
Falta para novo adiantamento (80% saldo): R\$ 3.441.985

EXECUÇÃO DO PLANO DE AQUISIÇÃO DO PROGRAMA


	PLAN		Previsto		TdR Elaboração		TdR Concluído		Processo em curso		Contratados	
	US\$	QTDE	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%
BENS	29,8	80	15,0	19%	11,0	14%	12,0	15%	5,0	6%	38	48%
OBRAS	0,0	0	0,0	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
CAPACITAÇÃO	0,8	77	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	1,0	1%	75	97%
SERVIÇOS Ñ CONSULTORIAS	24,0	29	4,0	14%	2,0	7%	6,0	21%	0,0	0%	17	59%
CONSULTORIA FIRMAS	33,0	17	1,0	6%	2,0	12%	1,0	6%	8,0	47%	5	29%
CONSULTORIA INDIVIDUAL	0,2	4	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%	4	100%
TOTAIS	87,9	207	20,0	10%	15,0	7%	19,0	9%	14,0	7%	139	67%

ℳ = Análise Horizontal
US\$ = Em milhões

EVOLUÇÃO DOS TERMOS DE REFERÊNCIA

	2018		2019		2020		2021		TOTAIS	
	QTDE	R\$	QTDE	R\$	QTDE	R\$	QTDE	R\$	QTDE	R\$
TdR em Elaboração	0	0	0	0	3	3	10	17	13	19
TdR Concluído	44	151	46	101	43	41	47	42	180	334
Contratado	41	143	38	59	34	19	32	49	145	270
Compra de Vagas	17	0,2	24	0,5	16	0,3	15	0,2	72	1

R\$ = Em milhões

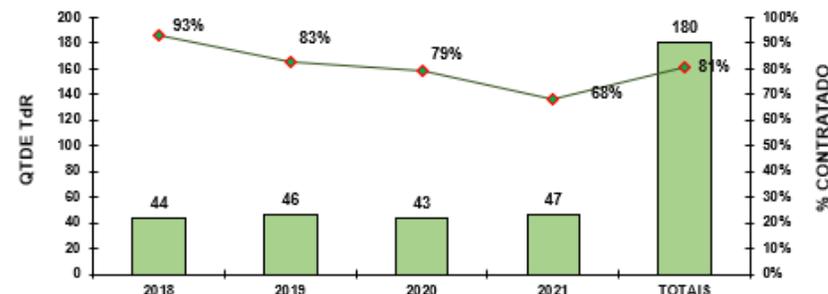



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

SANDRA MACHADO

Secretária Executiva de Planejamento e Gestão Interna

Coordenadora Geral do PROFISCO II CE

E-mail: sandra.machado@sefaz.ce.gov.br

Equipe:

Sônia Sisnando – Coordenadora Técnica da UCP/CE

Roger Mendes – Coordenador Administrativo Financeiro da UCP/CE

Marcos Saraiva – Coordenador do Controle Interno e Ouvidoria e Assistente de Monitoramento da UCP/CE
